

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 8288335 de 2025		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL APOYO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIA.		
Contratista:	DIEGO ALEJANDRO ALVARADO PIDIACHI		
No. de Cedula	1.072.663.494		
Fecha Inicio del Contrato	9-septiembre-2025	Fecha de Terminación	20-diciembre-2025
Periodo del Informe	9 septiembre al 8 de octubre 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 28.000.000.00
Valor a Pagar en este periodo	\$8.000.000.00
Saldo por Pagar	\$20.000.000.00
Pago No.	1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	90616650	Septiembre	\$ 340.800
Pensión			\$ 436.300
ARL			\$ 14.300
TOTAL			\$ 791.400

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR. **8288335** me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 09/09/2025 A 08/10/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar a la Secretaria de Obras Publicas en la ejecución de visitas técnicas en las cuales se realice levantamiento, recolección, revisión y análisis de la información de las condiciones actuales de la infraestructura y malla vial.	- Revisión de información de vías y espacio público, con el fin de alimentar las bases de datos de información de la infraestructura en plataformas digitales. - Se realiza visitas periódicas y registro fotográfico del avance de la construcción parque los colores. - Realización visita estación de policía.
2. Apoyar en la elaboración de los diferentes presupuestos de los proyectos a ejecutarse o en ejecución de infraestructura y manteniendo vial, esto de acuerdo con las diferentes necesidades del Municipio de Chía; así MISMO, aquellas que se requieran y que estén dentro del marco de las necesidades de los proyectos (estudios previos, análisis del sector, fichas técnicas, memorias de cálculo y conceptos técnicos entre otros) del Municipio de Chía.	Realización de presupuesto del Mantenimiento de la estación de policía el CURUBITO. Realización de presupuesto del proceso de Mantenimiento de fachadas de la zona histórica.
3. Asistir a las reuniones, comités y mesas de trabajo, realizando el apoyo especializado en los	Mesas de trabajo ASOJUNTAS definición de fachada Mesa de trabajo estación de policía para mantenimiento

procesos que adelante la Secretaría de Obras Públicas y presentar al supervisor del contrato un informe en que se detalle el fin de la reunión y las conclusiones.	
4. Apoyar a la Secretaría de Obras Públicas en la elaboración de cronogramas para el trabajo y levantamiento de información de la infraestructura en plataformas digitales.	Elaboración de cronogramas del estado actual de las vías y programación de sus respectivos mantenimientos durante el año, lo cual se realiza mediante plataformas digitales (google earth), con el fin de realizar seguimiento del estado y mantenimiento de la red vial - Programación mantenimientos en mdc-19 - Programación mantenimientos Slurry - Programación mantenimientos Recebo - Programación mantenimientos Pavimento en frío Se realiza el cronograma y programación de vías, las cuales se comprarán con las actividades ejecutadas en campo y así poder alimentar la plataforma digital (google earth), con el fin de mantener actualizadas las intervenciones viales
5. Brindar acompañamiento técnico en la elaboración de estudios previos, análisis del sector, presupuestos, fichas técnicas, memorias de cálculo entre otros, de los diferentes procesos que adelanta la Secretaría de Obras Públicas en relación a proyectos de infraestructura y malla vial.	Realización de estudios previos y análisis del sector del proceso de mantenimiento de la estación de policía el churubito. Realización de estudios previos y análisis del sector del proceso de mantenimiento de fachadas de la zona histórica

1. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Apoyar a la secretaria de Obras Publicas en la ejecución de visitas técnicas en las cuales se realice levantamiento, recolección, revisión y análisis de la información de las condiciones actuales de la infraestructura y malla vial.

Visitas técnicas de obra y conceptos técnicos en relación al estado de las vías:
Vías en pavimento asfáltico. Se realiza visita de campo a las vías a intervenir durante este periodo, visita de tipo técnico, realizando recorrido y determinando los diferentes daños presentes en el pavimento y su respectiva intervención encontrando los siguientes daños: piel de cocodrilo, baches, hundimientos y fisuramientos. Para su mantenimiento se utilizará mezcla densa en caliente. Se realiza corte, limpieza y retiro de material fatigado, suministro e instalación de MDC-19

Equipo: Cortadora, Volquetas, reto cargador vibro compactador y herramienta menor.

1.1 Avenida Chilacos entre Calles 17 y 19

ANTES



DURANTE




DESPUES



1.2 Carrera 2 entre Calles 16 y 17 - Barrio San Francisco



Avenida Chilacos entre Calle 19 y Carrera 13

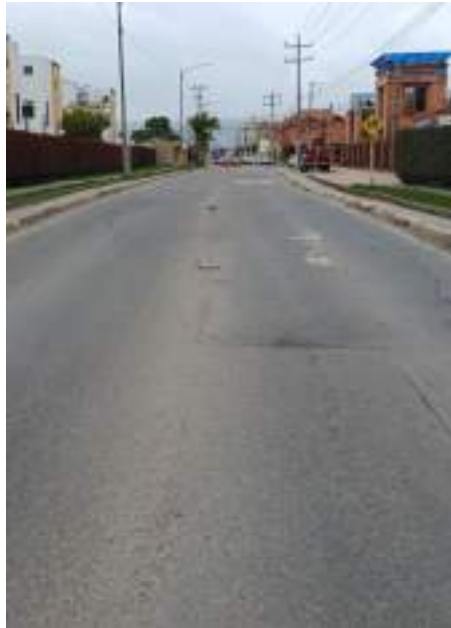

1.4 Carrera 1 A con Calle 6 y Calle 6 entre Carreras 1 A Y 1 (Variante Chía - Cota) - Barrio El Cairo



1.5 Carrera 1 A entre Calles 7 y 6, Barrio El Cairo

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.6 Carrera 1 A entre Calles 5 y 2 - Barrio El Cairo

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.7 Calle 19 entre Avenida Chilacos y Carrera 13

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.8 Carrera 2 Este entre Calles 26 (Camino La Floresta) y 29

ANTES



DURANTE



DESPUES



Vías pavimento en frio: Se realiza visita de campo a las vías a intervenir durante este periodo, visita de tipo técnico, realizando recorrido y determinando los diferentes daños presentes en el pavimento y su respectiva intervención encontrando los siguientes daños: baches, hundimientos y fisuramientos. Para su mantenimiento se utilizará material granular (b-400, fresado o material reciclado) y/o asfaltita natural y emulsión asfáltica. Se realiza el mantenimiento de la estructura corte, limpieza y retiro de material fatigado, suministro e instalación del material.

Equipo: Cortadora, Volquetas, reto cargador vibro compactador, motoniveladora y herramienta menor.

1.9 Vía Sector Las Juntas - Vereda La Balsa

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.10 Camino Las Eses entre Caminos El Chorro y El Cerro - Vereda Fonqueta

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.11 Calle 5 A con Carrera 1 A - Barrio El Cairo

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.12 Via Sector La Estrella (Camino Los Colorado) - Vereda Bojaca

ANTES



DURANTE



DESPUES



1.13 Camino El Eden entre Via a Cota y Camino El Cerro - Vereda Cerca de Piedra

ANTES



DURANTE



DESPUES



Vías pavimento en frio: Una vez se realiza el mantenimiento y/o recuperación de la estructura de la vía, se aplicará el sello Slurry

Equipo: Camión Slurry y herramienta menor.

1.44 Via Sector Los Salgados - Los Jota desde Camino El Chorro (Conjunto Terrafagua) hasta la vía a Tabio (Conjunto Villas del Marañon) - Vereda Tiquiza



1.15 Carrera 2 de Calle 1 Sur al Sur



Vías en recebo: Una vez se realiza visita técnica a la vía, se determina el deterioro y los daños presentes, por lo tanto, se hace indispensable el mantenimiento con B-400 o B-600 según disponibilidad de material. Se realiza el mantenimiento de la via, limpieza y retiro de material sobrante, suministro e instalación del material.

Equipo: Volquetas, reto cargador vibro compactador, motoniveladora y herramienta menor.

1.16 Vereda Yerbabuena Baja
ANTES



DURANTE



DESPUES



1.17 Via Chia-Tabio (Lourdes)
ANTES



DURANTE



DESPUES



1.18 Via Sectores Divino Niño - El Caguan - Vereda Yerbabuena
ANTES



DURANTE



DESPUES



2. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Apoyar en la elaboración de los diferentes presupuestos de los proyectos a ejecutarse en o en ejecución de infraestructura y manteniendo vial, esto de acuerdo con las diferentes necesidades del Municipio de Chía; así MISMO, aquellas que se requieran y que estén dentro del marco de las necesidades de los proyectos (estudios previos, análisis del sector, fichas técnicas, memorias de cálculo y conceptos técnicos entre otros) del Municipio de Chía.

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO CURUBITO DE LA POLICÍA				
ITEM	ICCU	CAPITULO	UND	CANTIDADES
1	1	PRELIMINARES		\$50.822.572
1.1	1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,00
1.2	1.8	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	ML	200,00
1.3	1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	100,00
1.4	1.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	50,00
1.5	1.13	DEMOLICION PAÑETE MURO	M2	900,00
1.6	1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	20,00
1.7	1.14	DEMOLICION CIELO RASO FALSO	M2	495,00
1.8	1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	70,00
1.9	1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	500,00
1.10	APU 1	DESMONTE ESTRUCTURAS EN MADERA DE CUBIERTA	UN	300,00
1.11	1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	60,00
1.12	1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	15,00
1.13	1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	50,00
1.14	1.46	RETIRO DE SOBRAINTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AURORIZADO)	M3	90,00
		CIMIENTOS		\$7.380.300
2.1	2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	5,00
2.2	2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	4,00
	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS		\$9.392.889
1.1	3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	10,00
1.2	3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	2,00
1.3	3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	45,00
	4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		\$24.683.574
	4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	4,00
	4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	1.800,00
	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	280,00
	4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	3,00
2	5	MAMPOSTERÍA		\$14.775.410
	5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	100
	5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	70,00
2.2	5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	70,00
3	6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		\$28.361.850
3.1	6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	550,00
3.2	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1.5 CM	M2	100,00
3.3	6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1.5 CM (LINEAL)	ML	600,00
4	7	CUBIERTAS		\$197.705.240
4.1	7.2	AFINADO IMPEMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	550,00
4.2	7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	30,00
	7.1	CANAL PVC AMAZONAS	ML	50,00
4.3	7.19	TEJA DE BARRO	M2	550,00
4.4	7.30	ESTRUCTURAS DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	550,00
4.4	7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	80,00
	APU 2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y BARNIZ EN TECHO DE BAMBÚ	M2	150,00
4.4	7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURALABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	80,00
5	9	CARPINTERIA EN MADERA		\$34.168.381
5.1	9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	30,00
5.2	9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	30,00
5.3	9.17	VENTANERIA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	10,00
5.4	9.31	VIDRIO TRANSPARENTE	M2	55,00
5.5	9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	5,00
5.6	9.20	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	10,00
	APU 3	SUMINISRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA MACIZA EN CEDRO	M2	10,00
5.7	9.22	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	4,00
		MORTEROS Y CONCRETOS		\$1.316.955
	8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	3,00
5	11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO		\$3.018.218
	11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	1
5.1	11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	30,00
	11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	6,00
	11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	6,00
	11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	6,00
6	12	INSTALACIONES ELECTRICAS		\$15.191.500
6.1	12.5	SALIDA LAMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	45,00
6.2	12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	65,00
6.3	12.21	LAMPARA 2X32 BAJO PLACA LAMINA LARTERIAL INDUSTRIAL	UN	40,00
		PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	\$	18.053.380,00
	14,5	ADOQUIN GRES PEATONAL	M2	60
	14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	50
	14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	20
	APU 4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMBOQUILLADO PARA PIEDRA NATURAL	M2	100
7	15	CIELO RASO		\$39.179.730
7.1	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	510,00
		EXCAVACIONES Y RELLENOS		\$536.526
	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRAINTES A UNA D	M3	3,00
	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	3,00
6	17	APARATOS SANITARIOS		\$7.410.174
6.1	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00
6.2	17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00
6.2	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00
8	18	PINTURAS		\$41.624.800
8.1	18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	ML	85,00
8.2	18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	1.100,00
8.3	18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	500,00
COSTOS DIRECTOS				\$492.304.544
AIU				\$147.691.363
TOTAL				\$639.995.907
elaboro: arq. Diego Alvarado				

3. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Asistir a las reuniones, comités y mesas de trabajo, realizando el apoyo especializado en los procesos que adelante la secretaria de Obras Públicas y presentar al supervisor del contrato un informe en que se detalle el fin de la reunión y las conclusiones.



Mesa de trabajo estación de policía tema mantenimiento estación

4. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Apoyar a la Secretaría de Obras Públicas en la elaboración de cronogramas para el trabajo y levantamiento de información de la infraestructura en plataformas digitales.


SISTEMA DE INFORMACION VIAL SIV



VIAS INTERVENIDAS DURANTE EL PERIODO

SEPTIEMBRE		
MDC-19		
ZU	AVENIDA PRADILLA ENTRE CARRERAS 4 Y 1 CALZADA SUR ASOCENTRO	0,634
ZU	CALLE 9 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 4	0,209
ZU	CARRERA 6 ENTRE CALLES 9 y 7	0,145
ZU	CARRERA 10 ENTRE CALLES 2 (VARIANTE CHIA-COTA) y 1 B - SECTOR SIATA	0,020
ZU	CARRERA 1 A ENTER AV PRADILLA Y CALLE 17 A - B. San Francisco	0,234
ZU	CALLE 16 A ENTRE CARRERAS 1 (VARIANTE CHIA-COTA) y 2 - B. San Francisco	0,070
ZU	CARRERA 2 ENTRE CALLES 16 Y 17 B. SAN FRANCISCO	0,240
ZU	AVENIDA CHILACOS ENTRE CALLE 19 Y CARRERA 13 ASOCENTRO	0,460
ZU	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1 A Y 1 (VARIANTE CHIA-COTA) - B.EL CAIRO	0,070
ZU	INTERSECCION CALL 5 CON CARRERA SECTOR SAN VALENTIN B. EL CAIRO	0,010
ZU	CARRERA 1 A ENTRE CALLES 7 y 6, B. EL CAIRO	0,024
ZU	CARRERA 1 A ENTRE CALLES 5 y 2 - B. EL CAIRO	0,162
ZU	CALLE 19 ENTRE AVENIDA CHILACOS Y CARRERA 13	0,200
PAV EN FRIO		
V-Bj	SECTOR LA ESTRELLA (LOS COLORADO) DE CRA 9 AL ORIENTE VBj	0,521
V-LB	VIA ENTRADA NUEVA SEDE COLEGIO SANTA MARIA DEL RIO	0,116
V-LB	SECTOR LAS JUNTAS	1,678
V-LB	VIA LAS JUNTAS PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR II	0,291
V-CP	CAMINO LOS LAVADEROS (RODADERO) ENTRE VIA LA LUCERNA Y CAMINO EL CERRO	0,344
V-Fq	CAMINO LAS ESES ENTRE CAMINOS EL CHORRO Y CAMINO EL SERRO V-Fq	0,828
ZU	CARRERA 1 A CON CALLE 5 B (FABRICA DE LAVADEROS) - B. EL CAIRO	0,105
V-CP	CAMINO EL EDEN ENTRE CAMINO EL CERRO Y VIA A COTA	0,500
SELLO SLURRY		
V-Tq	VIA SECTOR LOS SALGADO - LOS JOTA QUE UNE EL SECTOR TERRA FAGUA CON LA VIA A TABIO EN EL SECTOR CONJUNTO EL MARAÑON	0,626
V-LB	SECTOR SABANETA CARRERA 2 DE CALLE 1 SUR AL SUR	0,306
RECEBO		
	VIA CHIA - TABIO (LOURDES)	3,516
V-YB	VIA SECTORES DIVINO NIÑO - EL CAGUAN V-YB	1,300
V-YB	LOTE PARQUE YERBABUENA BAJA	0,330
V-LB	VIA COLINDANTE NUEVA SEDE COLEGIO SANTA MARIA DEL RIO	0,075
ADOQUIN		
V-Fq	SECTOR LA PAZ	0,240

PLATAFORMA DIGITAL

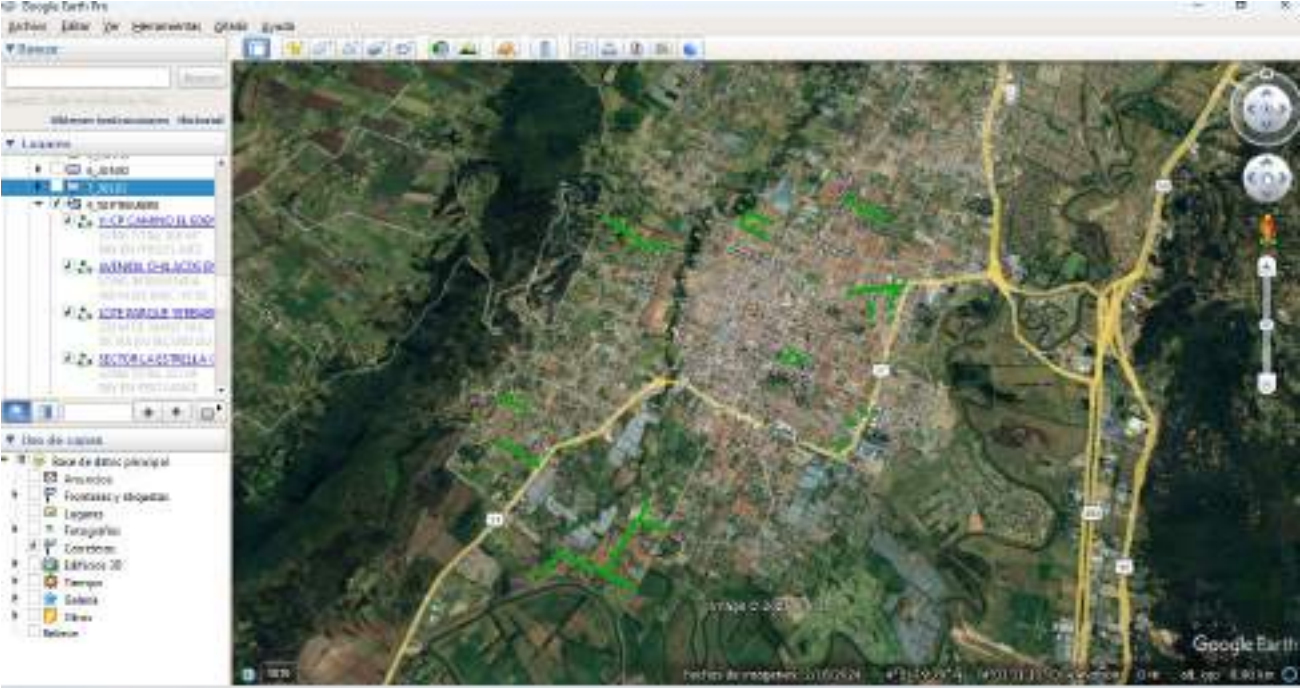

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO VIAL DURANTE EL PERIODO


ZONA URBANA Y RURAL MANTENIMIENTO EN ASFALTO MDC-19		SEPTI			
VEREDA	NOMBRE DE LA VÍA				
ZU	CARRERA 2 ESTE ENTRE CAMINO DE LA FLORESTA Y CALLE 29				
ZU	AVENIDA PRADILLA ENTRE CARRERAS 4 Y 1 CALZADA SUR ASOCENTRO				
ZU	CALLE 9 ENTRE CARRERA 7 Y 3 (TRAMO REALIZADO CARRERA 6 Y CARRERA 4)				
ZU	CARRERA 6 ENTRE CALLES 9 y 7				
ZU	CARRERA 10 ENTRE CALLES 2 (VARIANTE CHIA-COTA) y 1 B - SECTOR SIATA				
ZU	CARRERA 1 A ENTER AV PRADILLA Y CALLE 17 A - B. SAN FRANCISCO				
ZU	CALLE 16 A ENTRE CARRERAS 1 (VARIANTE CHIA COTA) y 2 - B. SAN FRANCISCO				
ZU	CARRERA 2 ENTRE CALLES 16 Y 17 B. SAN FRANCISCO				
ZU	AVENIDA CHILACOS ENTRE CALLE 19 Y CARRERA 13 ASOCENTRO				
ZU	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1 A Y 1 (VARIANTE CHIA-COTA) - B.EL CAIRO				
ZU	INTERSECCION CALL 5 CON CARRERA SECTOR SAN VALENTIN B. EL CAIRO				
ZU	CARRERA 1 A ENTRE CALLES 7 y 6, B. EL CAIRO				
ZU	CARRERA 1 A ENTRE CALLES 5 y 2 - B. EL CAIRO				
ZU	CALLE 19 ENTRE AVENIDA CHILACOS Y CARRERA 13				
ZONA RURAL MANTENIMIENTO EN FRIO		SEPTI			
VEREDA	NOMBRE DE LA VÍA				
V-CP	CAMINO LOS LAVADEROS (RODADERO) ENTRE LA VIA A LA LUCERNA Y EL CAMINO EL CERRO.				
V-Bj	CAMINO SECTOR LA ESTRELLA (LOS COLORADO) DE CARRERA 9 AL ORIENTE				
V-LB	VIA ENTRADA NUEVA SEDE COLEGIO SANTA MARIA DEL RIO				
V-LB	SECTOR LAS JUNTAS (ANTIGUA CALDERA DEL DIABLO)				
V-LB	VIA LAS JUNTAS PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR II				
V-Fq	CAMINO LAS ESES ENTRE EL CAMINO EL CERRO Y EL CAMINO EL CHORRO				
ZU	BARRIO EL CAIRO CRA 1 A CON CALLE 5B SECTOR FABRICA DE LAVADEROS.				
V-CP	CAMINO EL EDEN ENTRE CAMINO EL CERRO Y VIA A COTA				

ZONA URBANA Y RURAL APLICACIÓN DE SLURRY		SEPTI		
VEREDA	NOMBRE DE LA VÍA			
V-Tq	CARRERA 1 A CON CALLE 5 B FABRICA DE LAVADEROS - B. EL CAIRO	1		
V-LB	CAMINO EL EDEN ENTRE CAMINO EL CERRO Y VIA A COTA		1	
ZONA RURAL MANTENIMIENTO EN RECEBO		SEPTI		
VEREDA	NOMBRE DE LA VÍA			
V-Tq	VIA CHIA - TABIO (LOURDES)			
V-YB	VIA DE SECTOR DIVINO NIÑO SECTOR EL CAGUAN			
V-YB	LOTE PARQUE YERBABUENA BAJA			
V-LB	VIA COLINDANTE NUEVA SEDE COLEGIO SANTA MARIA DEL RIO			
MANTENIMIENTO VIAS ADOQUINADAS		SEPTI		
VEREDA	NOMBRE DE LA VÍA			
V-Fq	VDA FONQUETA FRENTE POLIDEPORATIVO LA PAZ SECTOR II			
REDUCTORES DE VELOCIDAD		SEPTI		
VEREDA	NOMBRE DE LA VÍA			
	CARRERA 10 ENTRE CALLE 2 (VTE CHIA COTA) Y CALLE 1 B			
	LA PROGRAMACION ANTERIOR ESTA SUJETA, EN TIEMPOS DE EJECUCION, AL SUMINISTRO DE MATERIALES (RECEBO- BASE B-600 - ASFALTITA NATURAL - ARENA ESPECIAL PARA SLURRY - EMULSION ASFALTICA, MEZCLA DENSA EN CALIENTE, ADOQUIN, CEMENTO, ETC). EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO SUMINISTRO, ES NECESARIO REPROGRAMAR LAS CUADRILLAS PARA LA RECONFORMACION DE			

5. OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

Brindar acompañamiento técnico en la elaboración de estudios previos, análisis del sector, presupuestos, fichas técnicas, memorias de cálculo entre otros, de los diferentes procesos que adelanta la secretaria de Obras Publicas en relación a proyectos de infraestructura y malla vial.

-Se anexan estudios y análisis realizados de los procesos mencionados (mantenimiento estación de policía y mantenimiento de fachadas zona histórica).


Contrista Diego Alvarado
c.c. 1072663494
